Календарный план проекта № 0011
"Организация сбора и переработки дикоросов на базе СПОК «Минор»"

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Организационного штаба управления проектами
_____ Р.Р. Пальталлер
"__"_____2016г.

Ид.	СДР	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Исполнитель	% заверш
0	0	**ПРОЕКТ №0011 Организация сбора и переработки дикоросов на базе СПОК «Минор»**	520 дней	Пт 01.01.16	Пт 29.12.17		40%
1	1	**Начало проекта**	0 дней	Пт 01.01.16	Пт 01.01.16	Курусканова Н	100%
2	2	**Подготовительные работы**	265 дней	Пт 01.01.16	Чт 05.01.17	Курусканова Н.С.	21%
3	2.1	**Анализ рынка отрасли**	5 дней	Пт 01.01.16	Чт 07.01.16	Курусканова Н.С	100%
4	2.1.1	Анализ сырьевой базы	5 дней	Пт 01.01.16	Чт 07.01.16	Курусканова Н.С	100%
5	2.1.2	Конкурентный анализ	2 дней	Пт 01.01.16	Пн 04.01.16	Курусканова Н.С	100%
6	2.1.3	Характеристика потребителей	3 дней	Пт 01.01.16	Вт 05.01.16	Курусканова Н.С.	100%
7	2.2	**Разработка технико-экономического обоснования проекта строительства производственного цеха по переработке дикоросов**	5 дней	Пт 08.01.16	Чт 14.01.16	Курусканова Н.С.	100%
8	2.3	**Подготовка разрешительной документации для технологического проектирования производственного цеха по переработке дикоросов**	20 дней	Пт 01.04.16	Чт 28.04.16	Курусканова Н.С.	100%
9	2.4	**Оформление земельного участка**	180 дней	Пт 29.04.16	Чт 05.01.17	Курусканова Н.С.;ООО "Землемер"	6%
10	3	**Строительство производственного цеха по переработке дикоросов**	180 дней	Пт 01.01.16	Чт 08.09.16	Памсю С. М.	35%
11	3.1	**Разработка проектно-сметной документации для строительства цеха**	25 дней	Пт 01.01.16	Чт 04.02.16	Курусканова Н.С.	100%
12	3.2	**Проведение строительно-монтажных работ в соответствии с проектом**	97 дней	Пн 18.04.16	Вт 30.08.16	Памсю С. М.	21%
13	3.2.1	Планировка площадки для строительства цеха	2 дней	Пн 18.04.16	Вт 19.04.16	Курусканова Н.С.;Памсю С. М.	100%
14	3.2.2	Расчистка территории под строительство производственного цеха	2 дней	Ср 20.04.16	Чт 21.04.16	Курусканова Н.С.;Памсю С. М.	100%
15	3.2.3	Земельные работы. Устройство опалубки	3 дней	Пт 22.04.16	Вт 26.04.16	Памсю С. М.	100%
16	3.2.4	Устройство оснований и фундамента	10 дней	Ср 27.04.16	Вт 10.05.16	Памсю С. М.	100%

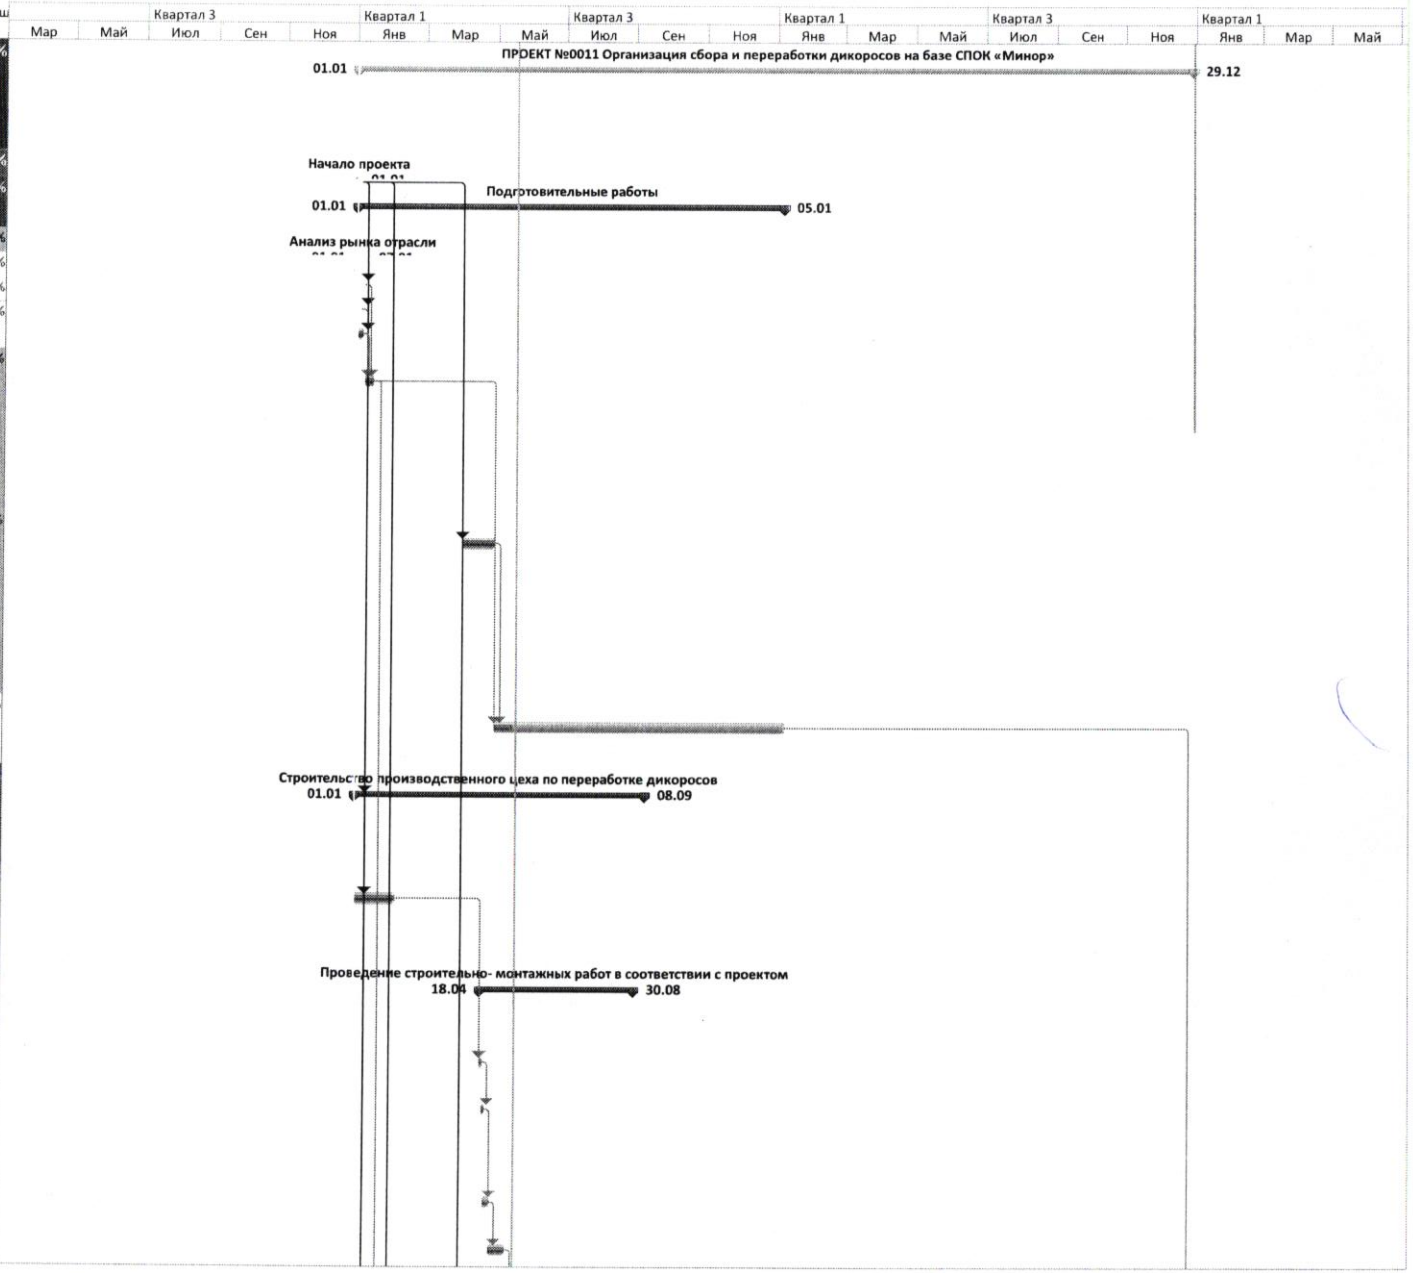

Согласовано:
Куратор проекта _____ Сакладов А.А. Заказчик проекта _____ Курусканова Н.С. "__"____2016 г. Руководитель проекта _____ Курсолтанов А.К. "__"____2016 г. Руководитель Проектного офиса _____ Ротарь Ф.Н. "__"___2016 г.

Календарный план проекта № 0011
"Организация сбора и переработки дикоросов на базе СПОК «Минор»"

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Организационного штаба управления проектами
_____ Р.Р. Пальталлер
"__"_____2016г.

Ид.	СДР	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Исполнитель	% заверш.
17	3.2.5	Возведение стен и крыши	25 дней	Ср 11.05.16	Вт 14.06.16	Памсю С. М.	12%
18	3.2.6	Устройство пола и потолка	5 дней	Ср 15.06.16	Вт 21.06.16	Памсю С. М.	0%
19	3.2.7	Монтаж окон и дверей	5 дней	Ср 22.06.16	Вт 28.06.16	Памсю С. М.	0%
20	3.2.8	Внутренняя планировка	5 дней	Ср 29.06.16	Вт 05.07.16	Памсю С. М.	0%
21	3.2.9	Подключение к инженерным коммуникациям (трубопроводы для воды, линии электроэнергии)	25 дней	Ср 06.07.16	Вт 09.08.16	Памсю С. М.	0%
22	3.2.10	Отделочные работы (внутренние и внешние)	15 дней	Ср 10.08.16	Вт 30.08.16	Памсю С. М.	0%
23	3.3	**Организация системы вентиляции и утилизации отходов**	**5 дней**	**Ср 31.08.16**	**Вт 06.09.16**	**Памсю С. М.**	**0%**
24	3.4	**Контроль качества и приемка работ**	**2 дней**	**Ср 07.09.16**	**Чт 08.09.16**	**Памсю С. М.**	**0%**
25	3.5	**Построен и запущен производственный цех по переработке дикоросов**	**0 дней**	**Чт 08.09.16**	**Чт 08.09.16**	**Курусканова Н.С.;Памсю С. М.**	**0%**
26	4	**Приобретение и монтаж нового оборудования по переработке дикоросов**	**119 дней**	**Пт 01.04.16**	**Ср 14.09.16**	**ООО "СтанкоТомск" Н.С.**	**10%**
27	4.1	**Заключение договора на поставку оборудования**	**2 дней**	**Пт 01.04.16**	**Пн 04.04.16**	**Курусканова Н.С.;ООО "СтанкоТомск"**	**100%**
28	4.2	**Поставка оборудования**	**10 дней**	**Пт 20.05.16**	**Чт 02.06.16**	**ООО "СтанкоТомск"**	**0%**
29	4.3	**Доставка оборудования до места назначения**	**5 дней**	**Пт 03.06.16**	**Чт 09.06.16**	**ООО "Транспортная компания"**	**0%**
30	4.4	**Монтаж оборудования**	**2 дней**	**Пт 09.09.16**	**Пн 12.09.16**	**ООО "СтанкоТомск"**	**0%**
31	4.5	**Проверка качества и комплектности оборудования**	**2 дней**	**Вт 13.09.16**	**Ср 14.09.16**	**Курусканова Н.С.**	**0%**
32	4.6	**Приобретено и смонтировано оборудование для переработки дикоросов**	**0 дней**	**Ср 14.09.16**	**Ср 14.09.16**	**Курусканова Н.С.;ООО "СтанкоТомск"**	**0%**
33	5	**Приобретение нового специализированного транспорта для транспортировки сырья**	**137 дней**	**Пн 01.02.16**	**Вт 09.08.16**	**Курусканова Н.С.;УАЗ Центр г.Бийск"**	**55%**

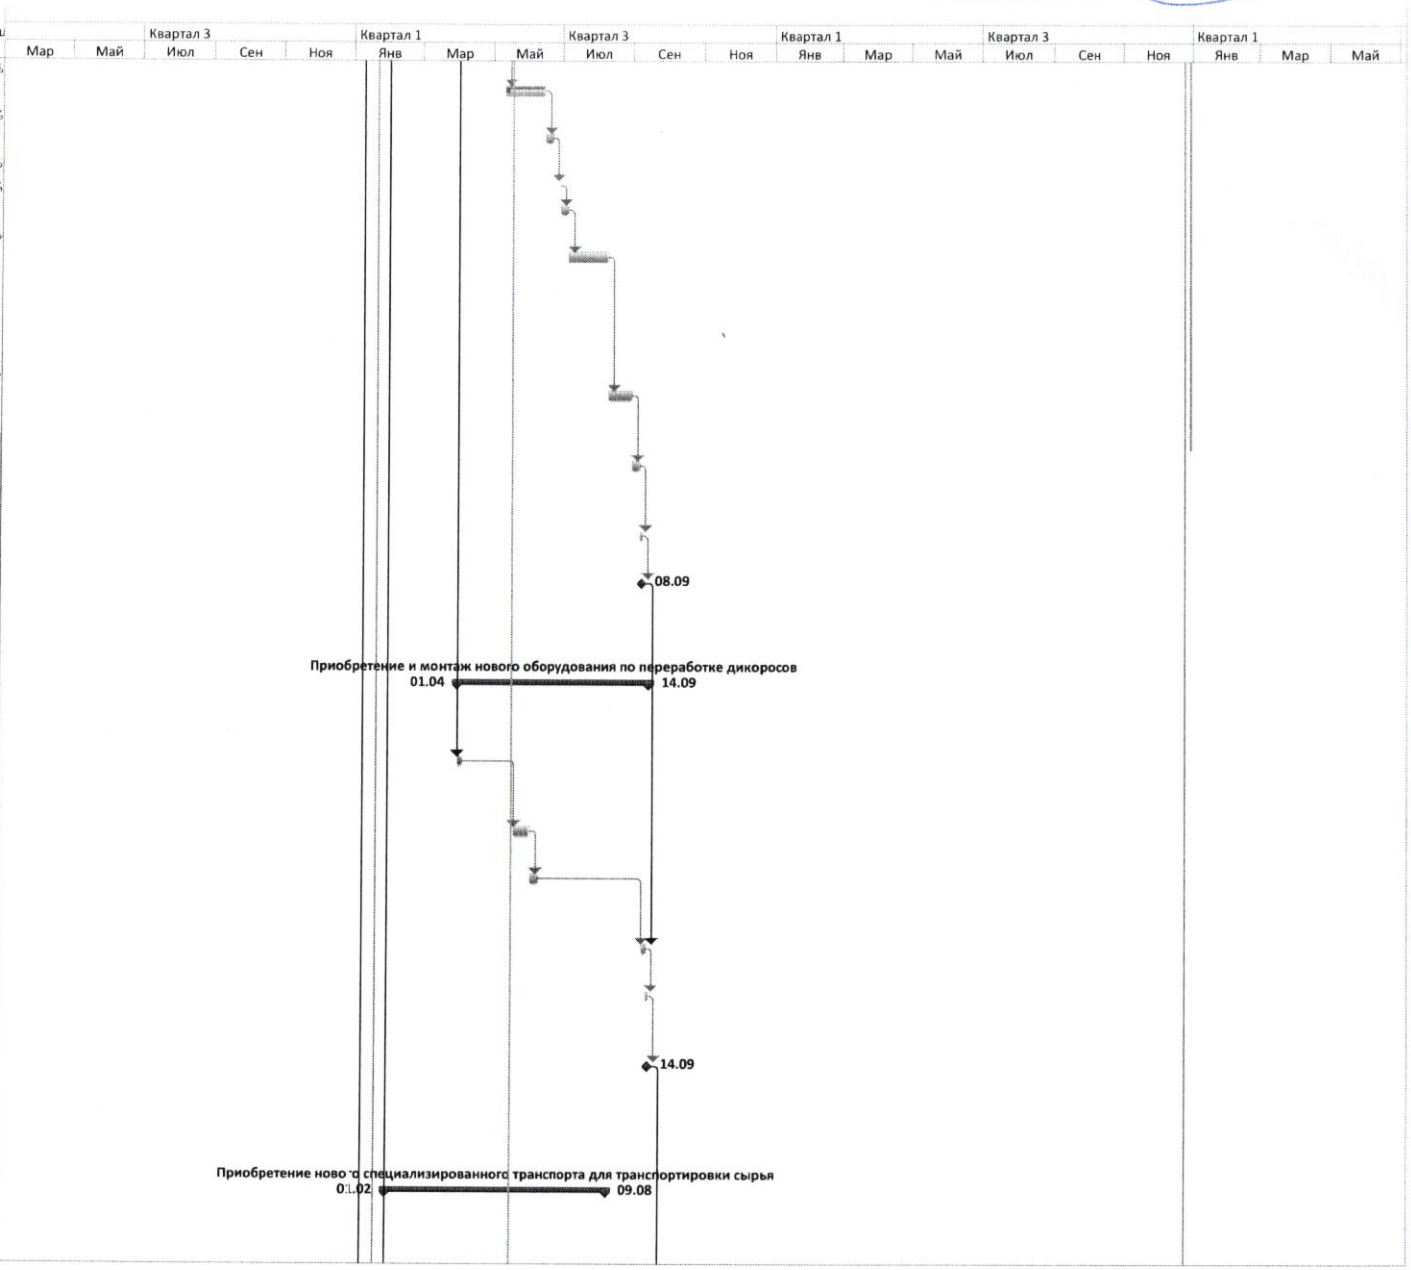

Согласовано:
Куратор проекта _____ Гайдадов А.А. Заказчик проекта _____ Курусканова Н.С. "__"____2016 г. Руководитель проекта _____ Нурсолтанов А.К. "__"_____2016 г. Руководитель Проектного офиса _____ Ротарь Ф.Н. "__"___2016 г.

Календарный план проекта № 0011
"Организация сбора и переработки дикоросов на базе СПОК «Минор»"

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Организационного штаба управления проектами
_____ Р.Р. Пальталлер
"__" _____2016г.

Ид.	СДР	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Исполнитель	% заверш
34	5.1	Заключение договора купли-продажи специализированного транспорта для транспортировки сырья	2 дней	Пн 01.02.16	Вт 02.02.16	Курусканова Н.С.;УАЗ Центр г.Бийск"	100%
35	5.2	Поставка специализированного транспорта	130 дней	Ср 03.02.16	Вт 02.08.16	УАЗ Центр г.Бийск"	56%
36	5.3	Доставка специализированного транспорта до места назначения	5 дней	Ср 03.08.16	Вт 09.08.16	УАЗ Центр г.Бийск"	0%
37	5.4	Приобретен новый специализированный транспорт	0 дней	Вт 09.08.16	Вт 09.08.16	Курусканова Н.С.	0%
38	6	Организация производства	218 дней	Пт 01.01.16	Вт 01.11.16	Курусканова Н.С.	48%
39	6.1	Пуско-наладочные работы	5 дней	Чт 15.09.16	Ср 21.09.16	Курусканова Н.С.	0%
40	6.2	Обеспечение кадровыми ресурсами	189 дней	Пт 01.01.16	Ср 21.09.16	Курусканова Н.С.;Пустогачева Л.В.	51%
41	6.3	Разработка маркетингового плана продукции	5 дней	Пт 22.01.16	Чт 28.01.16	Курусканова Н.С.;Пустогачева Л.В.	100%
42	6.4	Разработка плана реализации продукции (плана сбыта)	5 дней	Пт 29.01.16	Чт 04.02.16	Курусканова Н.С.;Пустогачева Л.В.	100%
43	6.5	Создание производственных запасов сырья	218 дней	Пт 01.01.16	Вт 01.11.16	Курусканова Н.С.	44%
44	7	Запуск производства	0 дней	Вт 01.11.16	Вт 01.11.16	Курусканова Н.С.	0%
45	8	Вывод предприятия на проектную мощность	0 дней	Пт 29.12.17	Пт 29.12.17	Курусканова Н.С.	0%
46	9	Окончание проекта	0 дней	Пт 29.12.17	Пт 29.12.17	Курусканова Н.С.	0%

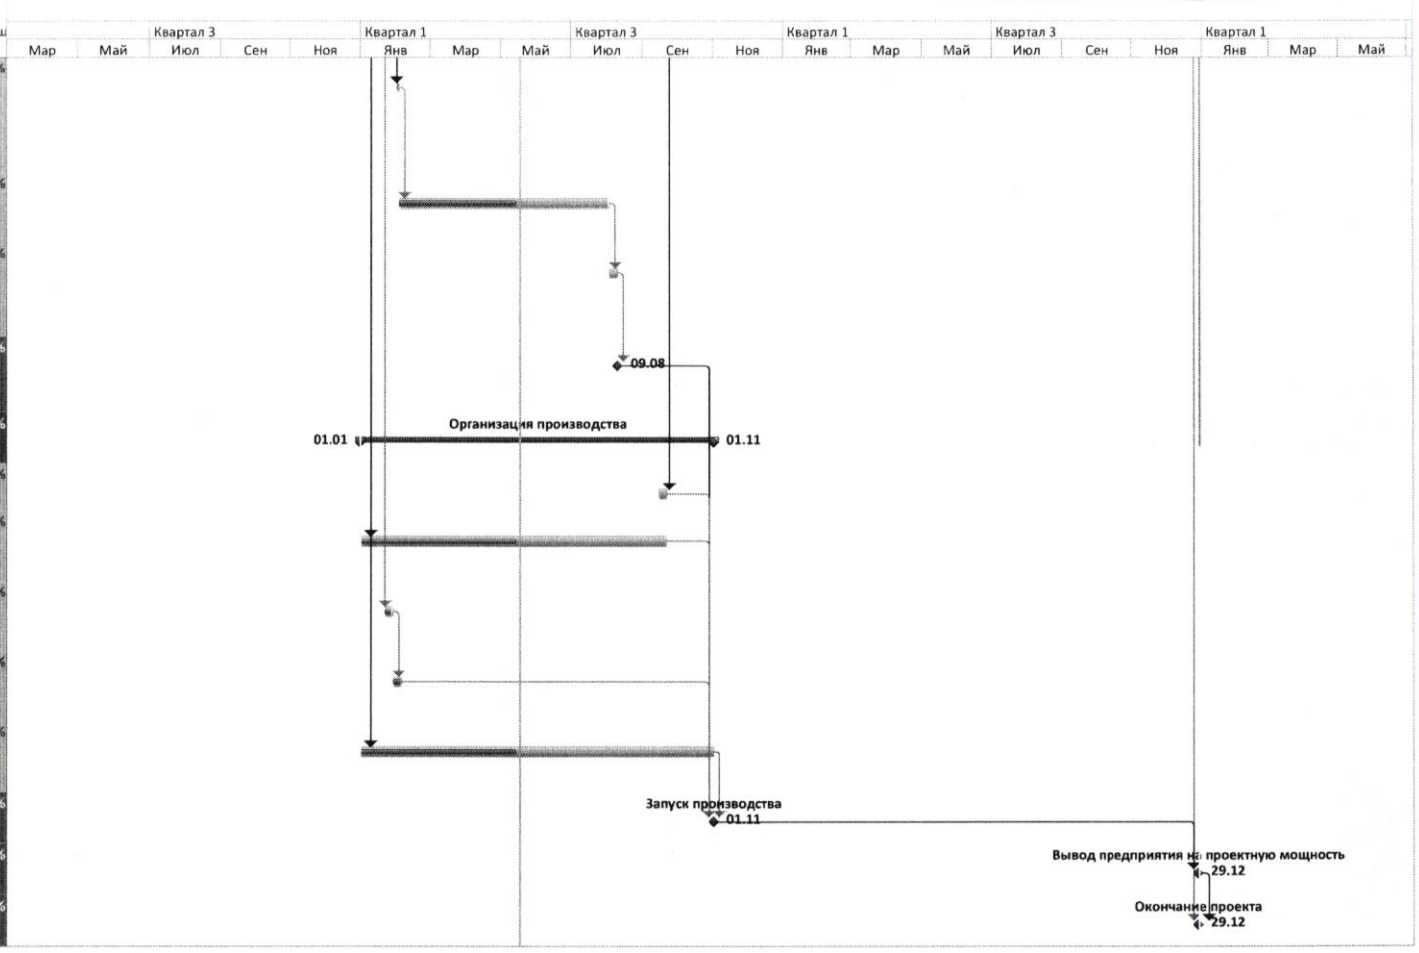

Согласовано:
Куратор проекта _____ Сакладов А.А. Заказчик проекта _____Курусканова Н.С. "__"____2016 г. Руководитель проекта _____Нурсолтанов А.К. "__"_____2016 г. Руководитель Проектного офиса _____Ротарь Ф.Н. "__"___2016 г.
